



BÉTON
PRÉFAB MJM




GUIDE D'INSTALLATION **DALLES BEAM**



GUIDE D'INSTALLATION EXPLICATIF



TABLE DES MATIÈRES

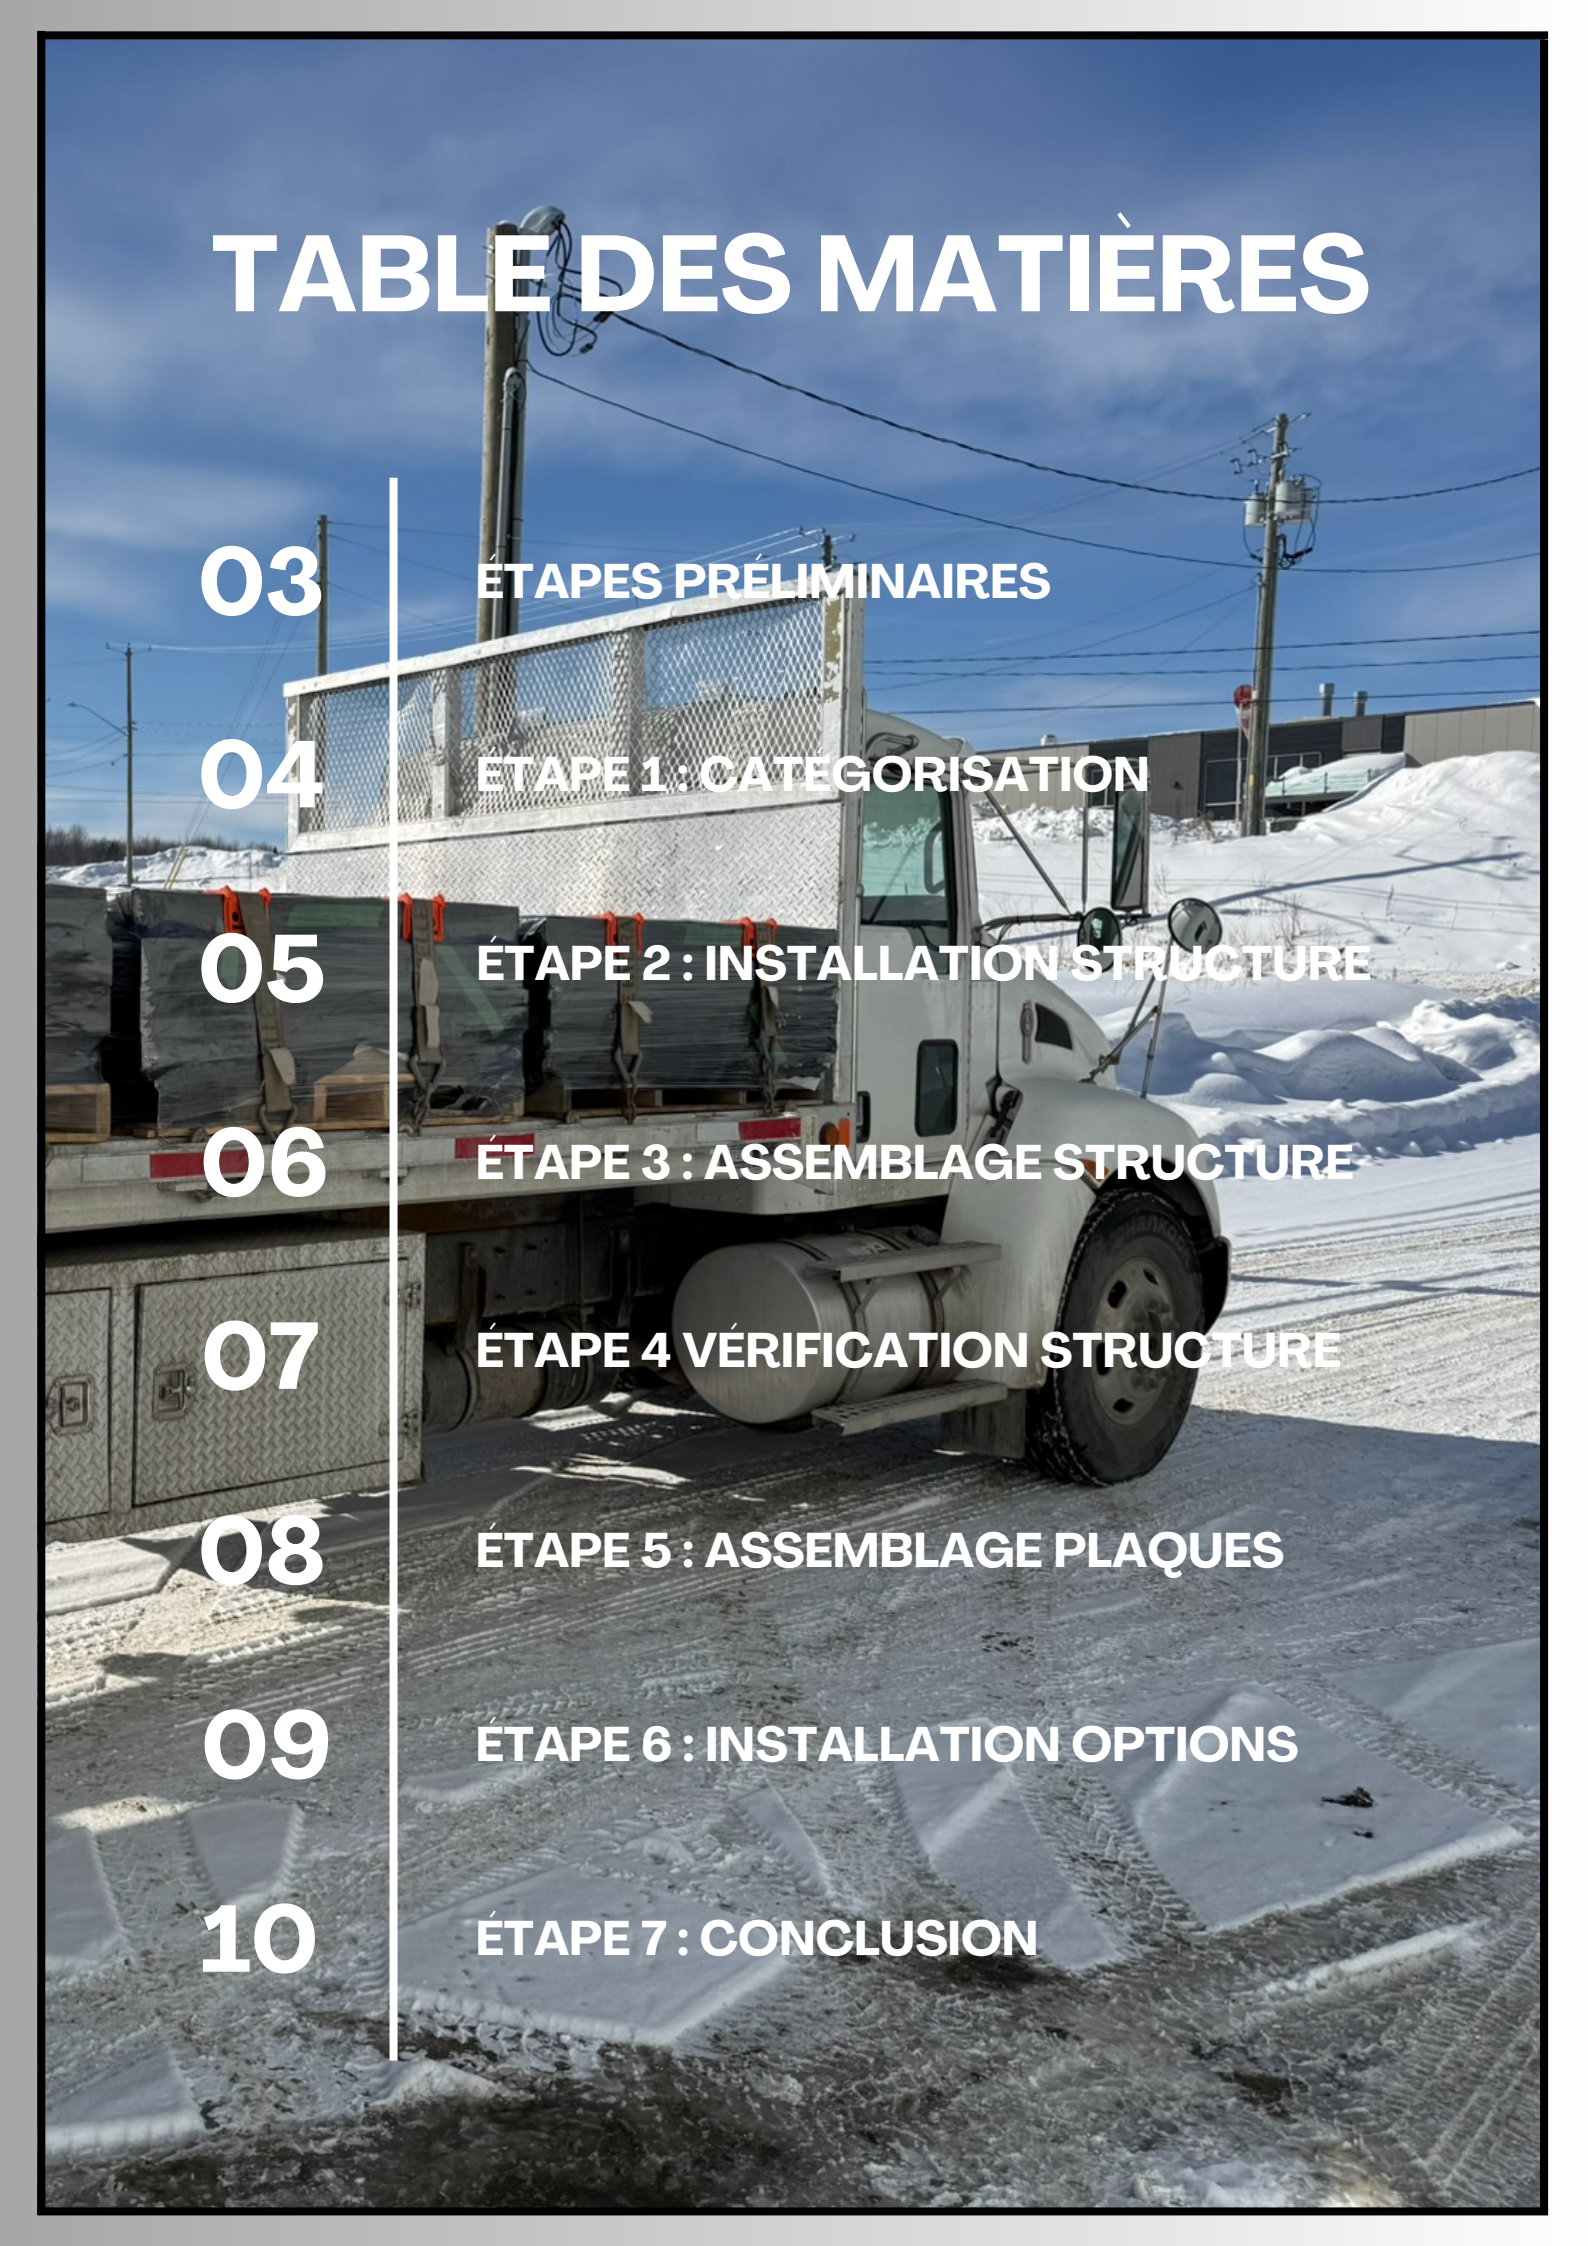

03

ÉTAPES PRÉLIMINAIRES

04

ÉTAPE 1 : CATEGORISATION

05

ÉTAPE 2 : INSTALLATION STRUCTURE

06

ÉTAPE 3 : ASSEMBLAGE STRUCTURE

07

ÉTAPE 4 VÉRIFICATION STRUCTURE

08

ÉTAPE 5 : ASSEMBLAGE PLAQUES

09

ÉTAPE 6 : INSTALLATION OPTIONS

10

ÉTAPE 7 : CONCLUSION

GUIDE D'INSTALLATION - DALLES BEAM

Étapes préliminaires

- 0.1.** Effectuer la préparation de sol désirer pour accueillir le produit (**non-incluse dans les services offerts de l'entreprise**).
- 0.2.** Assurez-vous que le sol est bien nivelé et qu'il possède la compaction ainsi que l'isolation souhaitées selon le type de sol que vous avez. Nous conseillons de préparer le sol de la même façon qu'une coulée de béton standard.



GUIDE D'INSTALLATION - DALLES BEAM

Étape 1 : Catégoriser les morceaux de béton

- 1.1. **Structurer** les morceaux de béton selon leurs **types** ainsi que leur **code de numérotation**.
- 1.2. Les **cadrages de centre** ont les 4 faces identiques.
- 1.3. Les **cadrages de contour** ont une à plusieurs faces esthétiques selon leur emplacement. Il est important de bien **assembler les morceaux** de la structure à son **endroit respectifs** pour vous permettre de créer un “**nosing**” (si applicable) et de préparer l'installation.
- 1.4. Les **plaques** sont tous identiques (sauf exception selon votre projet).



GUIDE D'INSTALLATION - DALLES BEAM

Étape 2: Installation de la structure (cadrages)

- 2.1.** Installer la **structure** du produit sur le **sol compacté** et préparé selon vos besoins.
- 2.2.** Il est important de bien **enligner les cadrages** pour s'assurer d'avoir une **surface droite et au niveau** (utiliser des outils de mesure si nécessaire).
- 2.3.** Ne pas oublier de mettre les **cadrages de contour** à l'**extérieur**.
- 2.4.** Vérifier pour n'avoir aucune **saleté ou roche** sur la structure qui pourrait **nuire** à l'installation des plaques.



GUIDE D'INSTALLATION - DALLES BEAM

Étape 3 : Assemblage de la structure


- 3.1. Attacher** les cadrages avec les **visses et écrous offerts**.
- 3.2.** Il est important de bien serrer les visses mais sans **exagérer la force** utilisée par **risque de faiblesses et ou fissuration**.
- 3.3.** Les joints entre les cadrages devraient être à **moins de 1/16"** après cette étape.



GUIDE D'INSTALLATION - DALLES BEAM

Étape 4 : Revérifier le niveau de la structure

- 4.1. Analyser** une dernière fois le **niveau final** de la structure avant l'**emboîtement des plaques**.
- 4.2.** S'il y a une **erreur** sur le nivellement du sol ou autre, **corriger** celle-ci **avant** la prochaine étape.

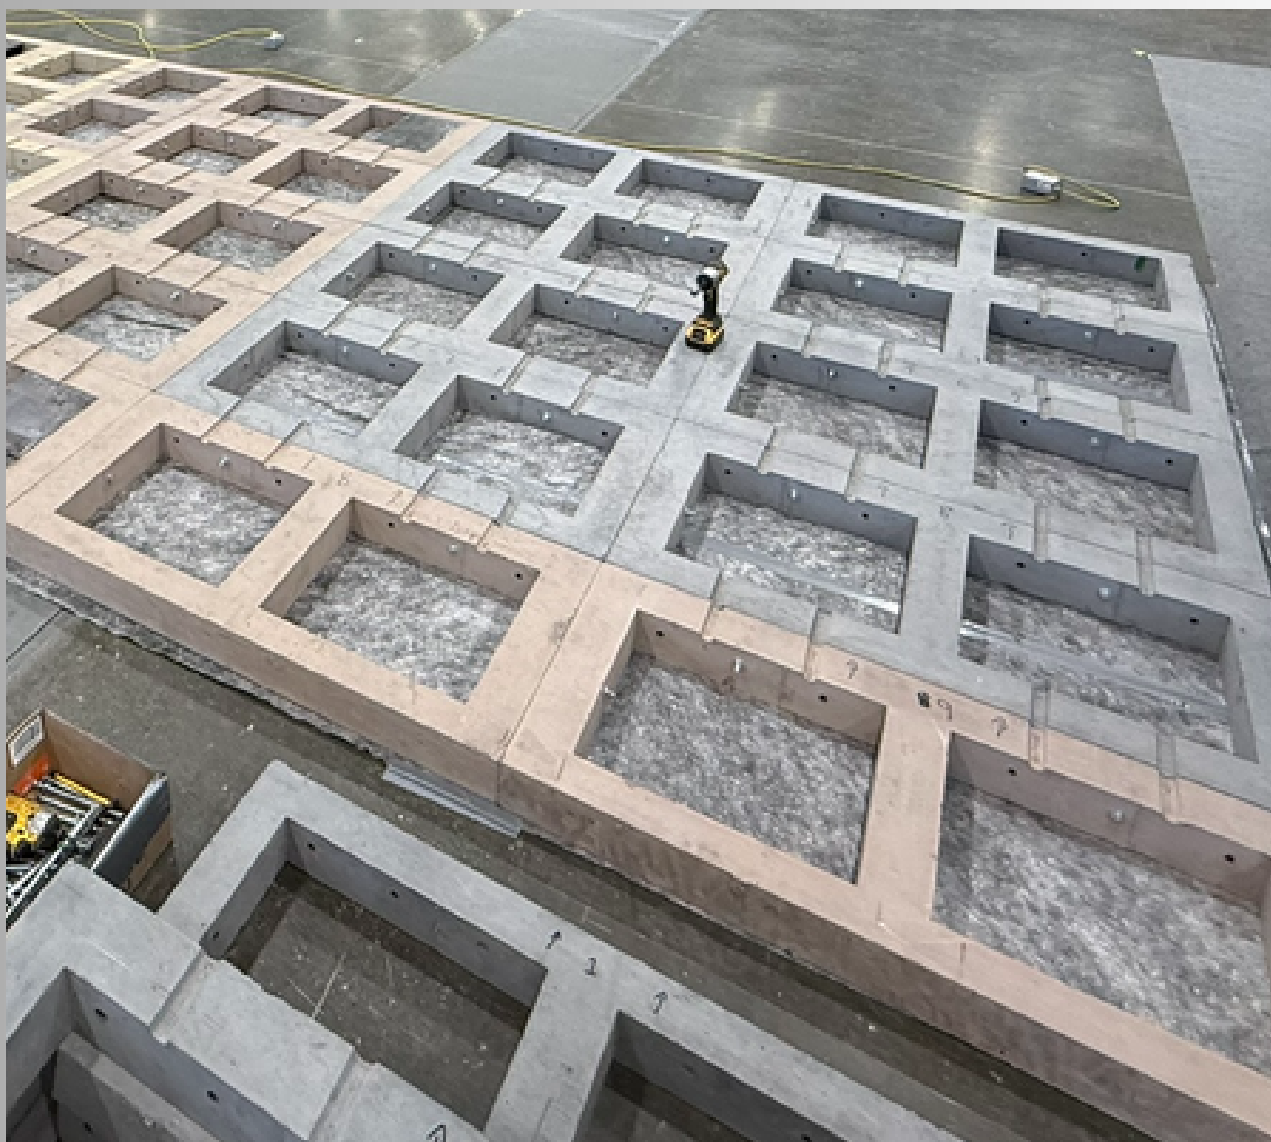

GUIDE D'INSTALLATION - DALLES BEAM

Étape 5 : Emboîter les plaques sur les cadrages

- 5.1. Emboîter** les plaques à la structure en les déposant **prudemment** sur les cadrages.
- 5.2.** Nous conseillons de les **poser à 90°** sur le haut du cadrage et de les **descendre doucement**.
- 5.3.** Utiliser le **poids du corps** au besoin pour **nivelé** la plaque correctement.
- 5.4.** S'il semble avoir un léger **flottement** de la plaque, vérifier s'il y a pas un **débris** entre la structure et la plaque qui pourrait créer cette **ondulation**.



GUIDE D'INSTALLATION - DALLES BEAM

Étapes 6 : Installation des options (si applicable)

- 6.1. Personnaliser** votre produit avec les **options** et ou **améliorations** que vous avez choisi préalablement.
- 6.2. Poser** vos lumières, un palier, une clôture, etc. pour améliorer votre espace.



GUIDE D'INSTALLATION - DALLES BEAM

Étape 7 : Profitez de votre espace

- 7.1. **Apprécier** votre nouvel aménagement une fois le **produit fini installé**.
- 7.2. N'oublier pas de **remplir** notre **sondage de satisfaction** une fois disponible et de nous faire part de votre **expérience**!

